KAK Prosjektet

Kommunikasjonsløsning for akuttmedisinsk kjede (KAK)

Anskaffelse, etablering og utskifting av ICCS på alle AMK sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak

Overgang fra ICCS til LifeX

ICCS

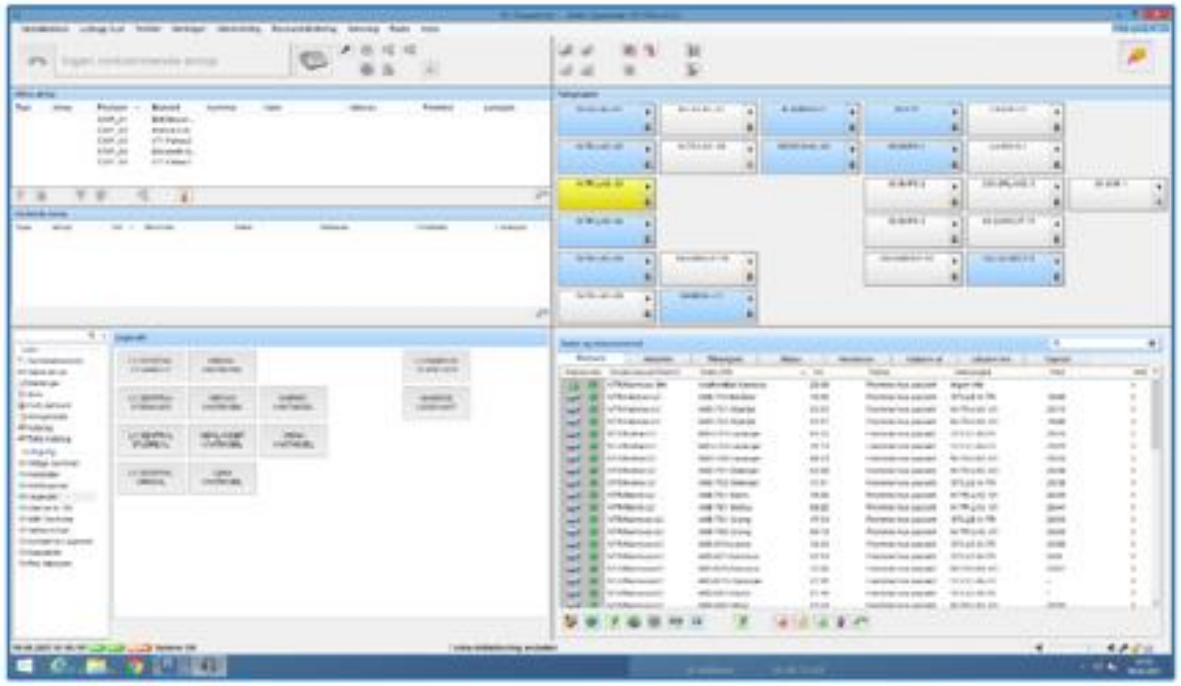

LifeX

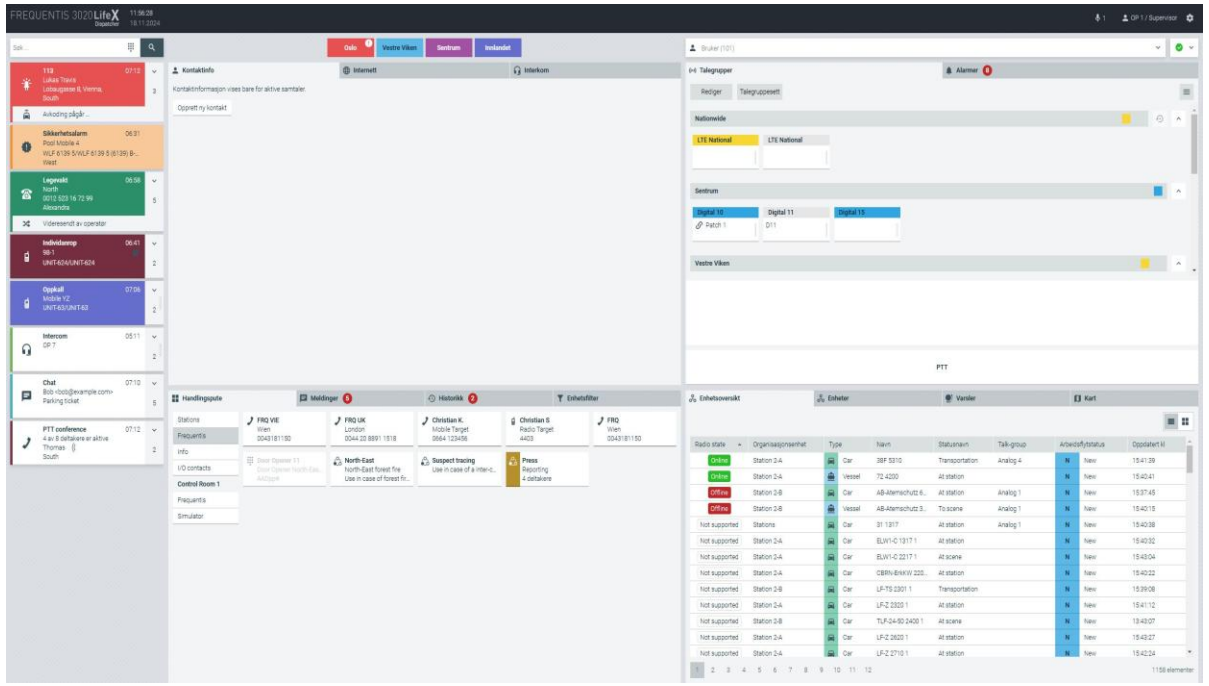



Overordnet plan

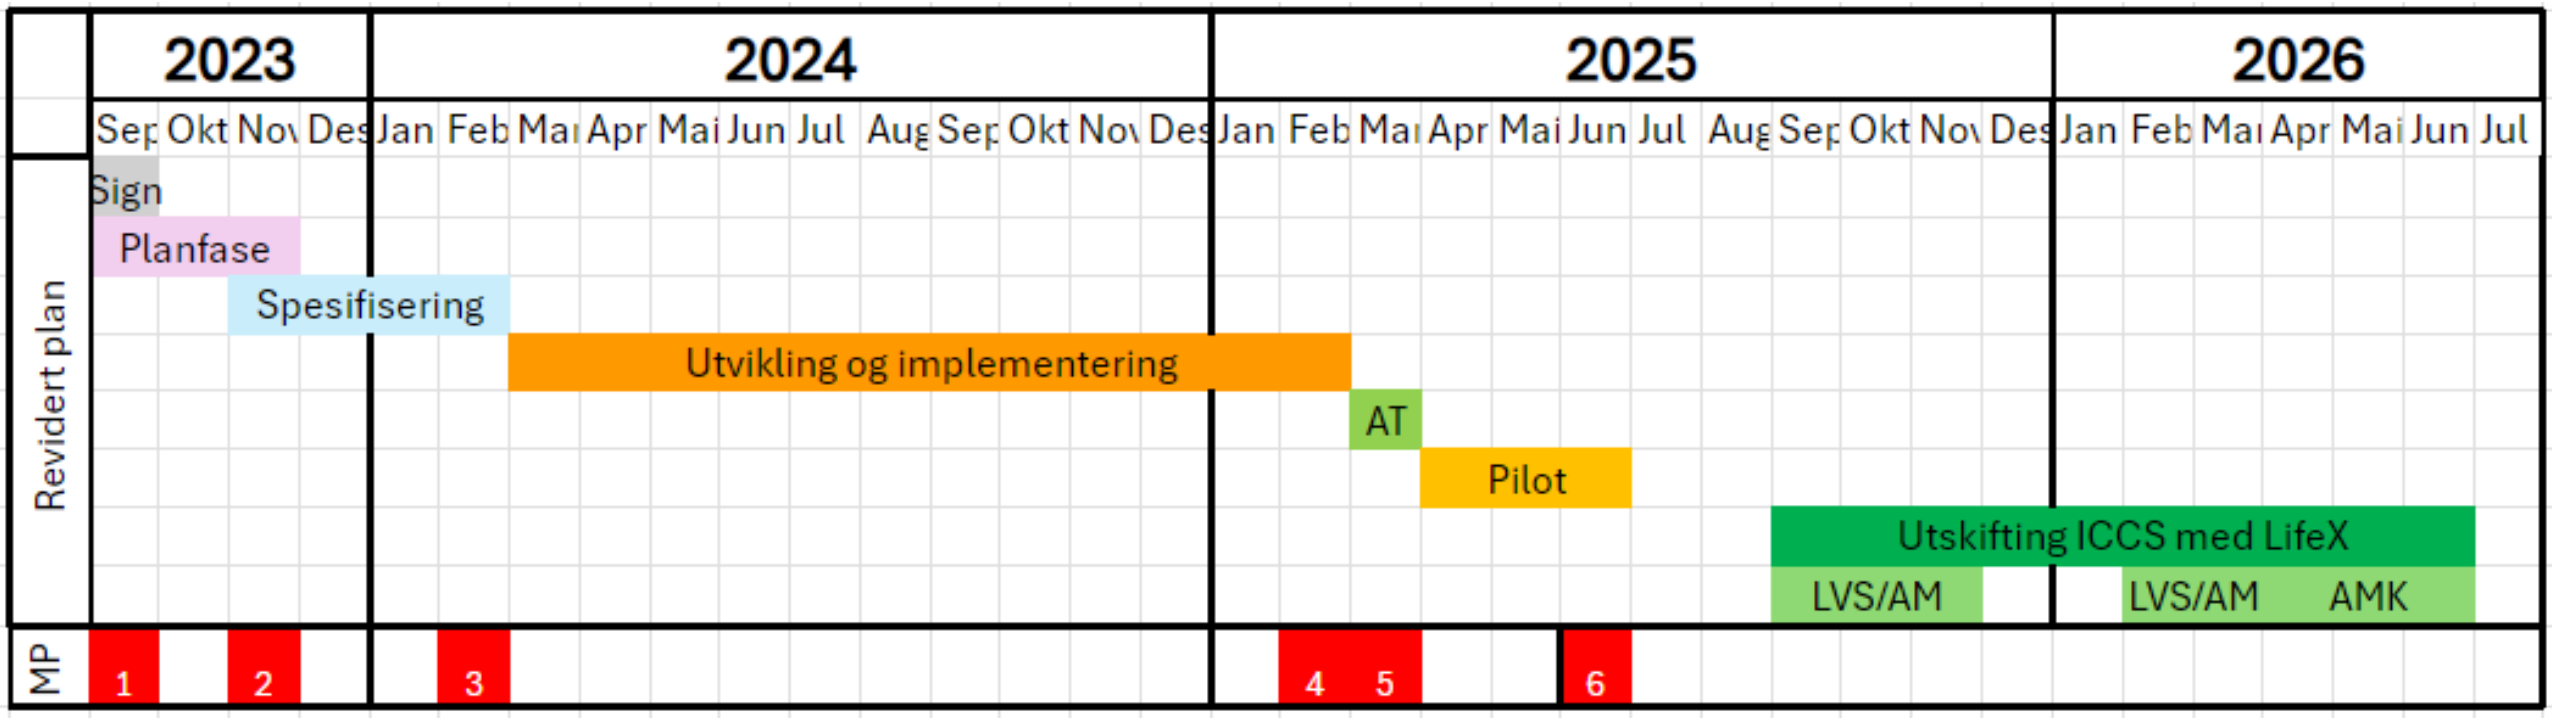

Pilot (godkjenningsperiode)

- Legevaktsentraler:
  - Lofoten interkommunale legevakt
  - Bodø legevakt
- Akuttmottak
  - Akuttmottaket, Tromsø, UNN
- AMK sentraler
  - AMK Sør-Trøndelag
  - AMK Møre og Romsdal

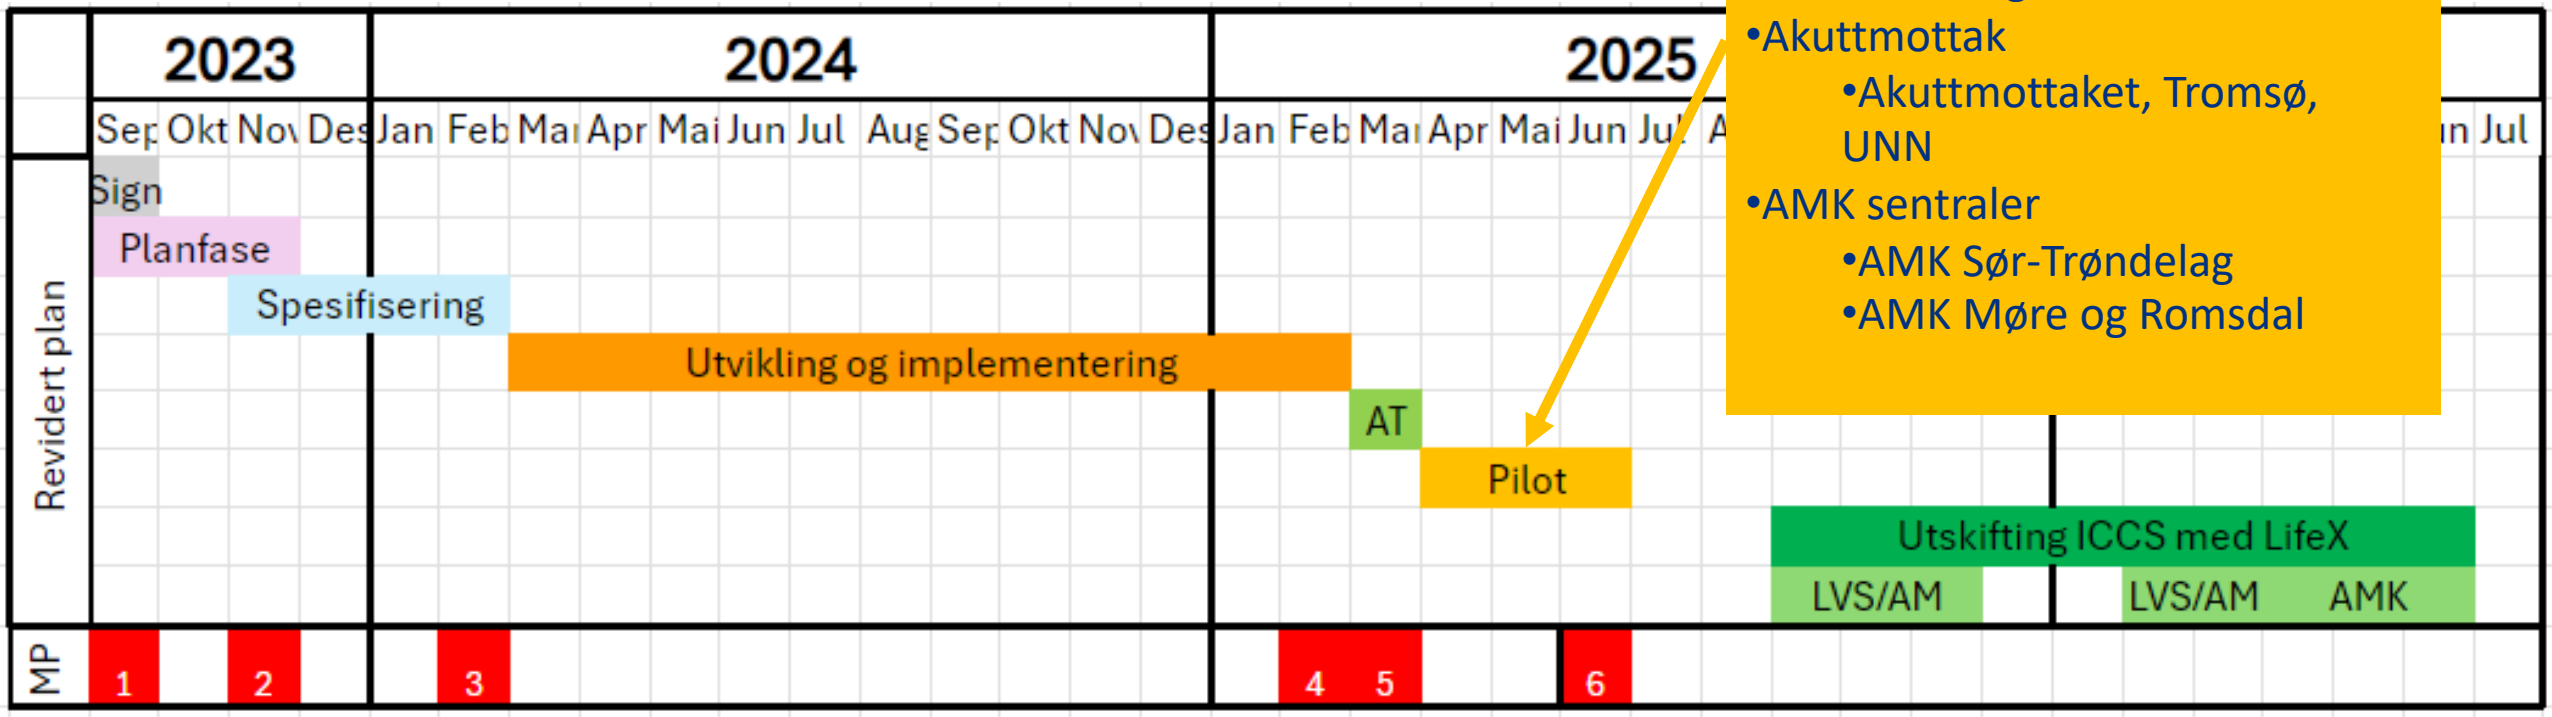

Fordeling av oppgaver og ansvar mellom Legevaktsentraler/HF og HDO

Roller og ansvar

- For spesialisthelsetjenesten vil RHFene ha ansvar for innføring i sin region
- For kommunehelsetjenesten vil den enkelte legevaktsentral ha ansvar for innføring på sin sentral
- HDO vil støtte og veilede RHFene og den enkelte legevaktsentral gjennom hele innføringsprosessen
- HDO vil ha et overordnet nasjonalt ansvar for at innføringen gjennomføres i henhold til planen

Hva betyr innføring for den enkelte sentral?

- Lokal koordinering
- Fristilling av ansatte for gjennomføring av opplæring
  - Instruktører opplæres sentralt, sluttbrukere opplæres lokalt
- Kvalitetssikring av egen konfigurasjon
- Innføringsprosjektet stipuleres til å vare 3 måneder pr sentral.

Plan for utskifting av ICCS med LifeX, og Nice lydlogg med Voxlog

Innføringsplan for legevaktsentraler og akuttmottak

- LifeX vil innføres i helsetjenesten i den rekkefølgen det er mest hensiktsmessig å fase ut ICCS
  - Legevakter og akuttmottak før AMK sentraler
  - Starte i nord, deretter midt og vest før sør-øst
  - Samlokaliserte legevakter og akuttmottak tas samme dag

- Ny medielogg-løsning vil innføres sammen med LifeX.
  - HDO vil automatisk sørge for at all lyd fra LifeX logges i denne løsningen når LifeX settes i drift på legevaktsentralen

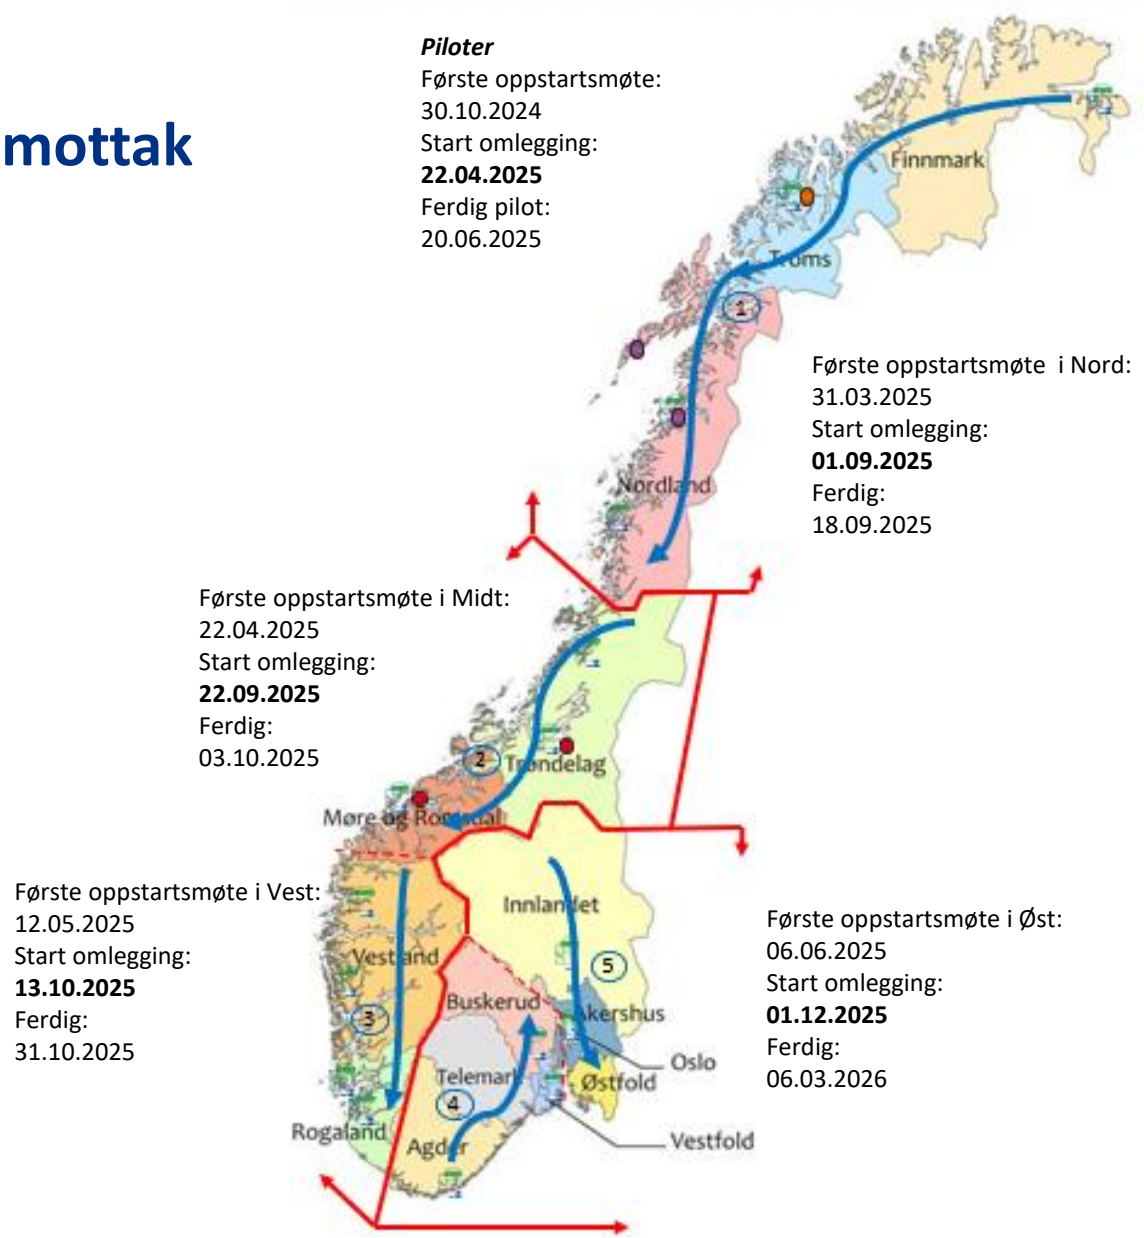

Nå starter innføringen «for alvor»

- Fysiske oppstartsmøter for lokale innføringsprosjekter
  - Plan for aktiviteter pr lokasjon
  - Hvordan vi samarbeider og rapporterer status på aktiviteter i innføringsperioden

	Uke 14							Uke 15				
CR navn	31.03.2025 Mandag	01.04.2025 Tirsdag	02.04.2025 Onsdag	03.04.2025 Torsdag	04.04.2025 Fredag	05.04.2025 Lørdag	06.04.2025 Søndag	07.04.2025 Mandag	08.04.2025 Tirsdag	09.04.2025 Onsdag	10.04.2025 Torsdag	11.04.2025 Fredag
Øst Finnmark Legevakt	PE								OLI		LKI	ROSI
Kirkenes Akuttmottak	PE								OLI		LKI	ROSI
Vadsø Legevakt		PE							OLI		LKI	ROSI
Kautokeino Legevakt			PE						OLI		LKI	ROSI
Nordkapp Helsesenter				PE						OLI	LKI	ROSI
Vest Finnmark Legevakt					PE					OLI	LKI	ROSI
Hammerfest Akuttmottak			PE							OLI	LKI	ROSI
Alta Legevakt					PE					OLI	LKI	ROSI
Nordreisa Legevaktsentral		ULK							PE			
Legevakta Tromsø			ULK							PE		
Flykoordineringssentralen				PE								
IK Legevakt Bardu				ULK							PE	
Finnsnes IK Legevaktssentral					ULK							PE

Mer informasjon: https://www.hdo.no/kak/

HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON
Nødnett

SØK MENY

Forside > Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Prosjekt for anskaffelse, etablering og utskifting av ICCS til en ny og moderne løsning; LifeX.
